

mlk. 29.9.2017
Pö C

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu

18. 09. 2014

Ohje POPELY

YHDISTYSTEN INVESTOINNIT KOORDINOINTI-HANKKEEN LOPPURAPORTTI



Oivangin lintutorni

1.4.2013 – 30.6.2014

YHDISTYSTEN INVESTOINNIT KOORDINOINTI -HANKE LOPPURAPORTTI

1. HANKKEEN HALLINNOIJA/TOTEUTTAJA

Hankkeen hallinnoija:	Toimintaryhmä Myötäle ry.
Hankkeen työntekijät:	Hankevastaava Marja Tuomivaara
Hankkeen ohjausryhmä:	Myötäle ry:n hallitus

2. HANKKEEN TUNNISTETIEDOT

Päätöksen tekijä:	Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hanke:	Yhdistysten investoinnit -koordinointihanke
Hankennumero:	20059
Hankkeen diaarinumero:	851/3570-2013
Ohjelma:	Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 ja Myötäle ry:n kehittämissuunnitelma
Toimintalinja:	Leader
Toimenpide:	Toimenpide 3, Kylien kunnostus ja kehittäminen
Hankkeen kesto:	1.4.2013 – 30.6.2014
Loppuraportin tekijä:	Hankevastaava Marja Tuomivaara

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Koko koordinointihankkeen kustannusarvio oli 78 398,59 €, josta hallinnoinnin kustannukset olivat 30,43 % ja Myötäle ry hallituksen valitsemille alahankkeiden investointeihin 69,57 %.

Alahankkeiden kustannusarviot olivat 1300 - 5000 euron välillä. Alahankkeiden tuki oli 75 %, josta omarahoitus voitiin kattaa 65 % talkootyöllä ja 35 % rahana.

Hankkeen hallinnoinnista vastasi Myötäle ry hankevastaava Marja Tuomivaara. Hankkeen ohjausryhmänä toimi Myötäle ry:n hallitus.

Hanke kohdistui toimintaryhmä Myötäleen toiminta-alueeseen, Taivalkosken ja Posion kuntiin sekä Kuusamon kaupunkiin. Kohderyhmiä olivat em. alueen rekisteröidyt

yhdistykset, seurat ja yhteisöt sekä toimijat, jotka toimivat kyläyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi, mukaan lukien kausiasukkaat koko toiminta-alueen viihtyisyyttä edistäen.

Yhteistyötahoina olivat toiminta-alueen yhteisöt, seurat, paikalliset asukkaat, kausiasukkaat ja kunnat.

Myötäle oli toteuttanut Koillismaan pienimuotoiset investoinnit ja Kylien investoinnit – koordinoitihankkeita vuosien 2011-2013 aikana, joiden kokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Kiinnostus pienimuotoisten hanketukien hakuun oli vilkasta. Myötäle ry haluaa jatkossakin tukea pienimuotoisia investointeja kylien yhdistyksille ja seuroille. Alahankkeiden myötä Leader –toimintaan saatiin paljon uusia hakijoita. Lisäksi havaittiin, että pienetkin investoinnit voivat olla merkittäviä toiminnan ja viihtyisyyden kannalta.

4.1. TAVOITTEET

4.a.

Ohjelmakauden 2007–2013 aikana Myötäleelle oli tullut useita sellaisia investointihankkeita, joita ei voitu rahoittaa. Syynä on ollut se, etteivät kustannukset ole olleet niin suuria, että yleishyödyllisen investointihankkeen minimitukimäärä 5000 € ylittyisi. Tällöin yhdistykset eivät ole voineet hakea investoinnille Leader-rahoitusta, ellei yhdistykseltä ole löytynyt samalla muita investointitarpeita, jotka voitaisiin yhdistää osaksi laajempaa hanketta.

4.b.

Koordinoitihankkeella mahdollistettiin ”hankemaailmaan” tutustuminen pienin taloudellisin panostuksin ja vähäisin hankebyrokraattisin menettelyin. Tällä tavoin voidaan vähentää erityisesti pienten ja vähävaraisten yhdistysten kynnystä hakea ja toteuttaa ensimmäistä hankettaan. Koordinoitihankkeen myötä Leader -hankkeiden käytäntö tulee tutuksi uusille yhdistyksille ja usko onnistumiseen lisääntyy. Koordinoitihankkeen tavoitteena onkin kannustaa hankekonkareiden lisäksi myös uusia yhdistyksiä mukaan kehittämään omaa toimintaansa ja asuinympäristöään sekä tutustumaan Leader-rahoituksen tuomiin mahdollisuuksiin.

Hankkeiden toteuttaminen edellyttää useita talkootyöhetkiä, jotka puolestaan kasvattavat kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä. Hankkeen myötä totutaan toimimaan yhdessä, tästä on erityisesti iloa niissä kylissä, joissa ei ole tällä hetkellä vahvaa yhdistystoimintaa tai talkoohenkeä. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen innostavat suunnittelemaan uutta toimintaa ja siten kylän kehittämiseen saadaan uusia virikkeitä koordinaatiohankkeen myötä.

4.2. HANKKEEN TOTEUTUS

C. toimenpiteet

Myötäle ry:n hallitus teki päätöksen Kylien investoinnit -koordinoitihankkeen hakemisesta hallituksen kokouksessaan 19.3.2013. Hallitus hyväksyi hankevastaavan tekemän hankesuunnitelman.

1. Aktivointi ja tiedottaminen

Hankkeesta tiedotettiin lehti-ilmoitusten ja -juttujen kautta sekä suoraan hanketoimijoille kylätilaisuuksissa. Myötäle ry:n aiemmin toteuttama Koillismaan pienimuotoiset investoinnit – koordinoitihanke poiki kyselyjä.

2. Kaksivaiheinen haku ja päätöksen teko

Kylien investoinnit – koordinoitihankkeen haku oli kaksivaiheinen.

Vaihe 1:

Myötäle ry:n hallitus haki tukea koordinoinnin osalle. Koordinointi piti sisällään ilmoitukset alahankkeiden hausta ja alahankehakemusten jättämisen toimintaryhmä Myötäle ry:lle. Koillismaan pienimuotoiset investoinnit – koordinoitihanke julkaistiin avoimeen hakuun 1.-31.5.2013 väliselle ajalle. Ilmoitukset julkaistiin paikallislehdissä: Koillissanomissa, Kuriirissa ja Taivalkosken Sanomissa. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin kylätilaisuuksien yhteydessä ja Myötäle ry:n nettisivuilla.

Määräaikaan mennessä tuli 17 alahankehakemusta, joista Myötäle ry:n hallitus päätti 14.6.2013 pitämässään kokouksessa tukea kaikkia 17 hanketta, joista Posiolta 3,

Kuusamosta 7 ja Taivalkoskelta 7. Alahankkeiden valinta perustui pisteytysjärjestelmään, joka oli hankehakijoilla tiedossa. Koordinoinnin hyväksytty rahoitussuunnitelma oli 23 860 € ja tuettavien alahankkeiden rahoitussuunnitelma oli 54 538, 59 €

Vaihe 2:

Toinen vaihe sisälsi alahankkeita koskevan hakemuksen jättämisen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, mikä pohjautui Myötäle ry:n hallituksen valitsemiin alahankkeisiin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki tukipäätöksen alahankkeiden osalta 19.09.2013. Näin alahankkeiden toimijat pääsivät toteuttamaan hankettaan.

Painopisteenä valittaville alahankkeille määriteltiin seuraavaa:

- seurat ja yhteisöt voivat toteuttaa pienimuotoisia rakentamis-, kone-, ja laite- ja kalusto -investointeja, joiden kokonaiskustannukset ovat 500 – 5 000 €
- hankeosaamisen ja –kokemusten lisääminen kylillä
- talkoohengen ja myönteisen ilmapiirin nostattaminen
- nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen
- uusien toimijoiden mukaan saaminen
- kylätalojen tai yhteisten tilojen rakentaminen ja kunnostus
- kulttuurin lisääminen ja tukeminen

D. aikataulu

- hanke sai 1. vaiheen päätöksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 17.4.2013
- alahankkeiden haku julkaistiin 1.-31.5.2013
- alahankkeiden valinta Myötäle hallituksessa 13.6.2013
- valinnannasta ilmoitettiin hakijoille sähköpostilla ja puhelimitse
- alahankkeiden hakemus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 27.6.2013
- alahankkeita koskeva 2. vaiheen päätös P-P ELY-keskukselta 19.9.2013
- alahankkeet pääsivät toteuttamaan hankettaan em. päätöksen jälkeen
- koordinoinnin maksatusta haettiin 1.1.-30.8.2013, 1.9.-31.12.2013 ja viimeistä maksatusta haetaan ajalta 1.1.-30.6.2014
- 17 alahankeen maksatusta haettiin 4 erässä, sitä mukaan kun hankkeet olivat toteuttaneet hankkeensa, viimeinen maksupäätös alahankkeista saatiin 28.3.2014
- Myötäle ry maksoi niin EU, valtio ja kuntarahan hankkeille heti maksupäätöksen saatuaan, maksukuittia vastaan Myötäle ry sai maksamansa EU ja valtion tukiosuuden takaisin, kuntaraha maksettiin Myötäle ry:n tililtä

E. resurssit

- hankkeen toteuttamisesta vastasi hankevastaava
- hankkeen ohjausryhmänä toimi Myötäle ry:n hallitus, joka käsitteli hankkeeseen liittyviä asioita normaalin hallituksen kokouksen yhteydessä, kustannuksia ei näin ollen tullut
- alahankkeet toteuttivat hankettaan hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti, jotkut jopa ylittivät kustannusarvonsa, mutta tukea voitiin maksaa vain päätöksen mukaisesti

F. toteutuksen organisaatio

- hankkeen hallinnoinnista ja organisaatiosta vastaa Myötäle ry:n hallitus ja henkilöstö
- alahankkeet vastaavat oman yhdistyksensä hankkeensa toteuttamisesta, josta on tehty jokaisen alahankkeen kanssa kirjallinen sopimus

G. kustannukset ja rahoitukset

- maksatusta on haettu koordinoinnin osalta kolmessa erässä
- alahankkeiden osalta maksatusta haettiin neljässä erässä

HYVÄKSYTTYJEN ALAHANKKEET KUSTANNUSARVIOINEEN

NRO	KUNTA	HANKEHAKIJAN NIMI	HANKKEEN NIMI	KOKONAIS-KUSTANNUS-ARVIO
1.	Kuusamo	Oivangin vesistöjen hoitoyhdistys ry	Oivangin kosteikon lintutorni	5 000,00
2.	Taivalkoski	Taivalkosken Näyttämöyhdistys ry	Teatteria ja elokuvia	3 700,00
3.	Taivalkoski	Eläkeliitto Taivalkosken yhdistys ry.	Vireyttä toimintaan	2 800,00
4.	Kuusamo	Purnunseudun metsästysseura	AV-laitteiden hankkiminen	2 080,00
5.	Posio	Anetjärven kyläyhdistys ry	Kalustohankinta	1 400,00
6.	Posio	Posion seurakunta	Kirkkopuistikon tarinapolku ja rantalaituri	5 000,00
7.	Taivalkoski	Taivalkosken 4H-yhdistys ry	Peräkärry ja kanootit	5 000,00
8.	Kuusamo	Vuotungin maamiesseura ry	Vuotungin kylätalon karaokelaitteisto	2 100,00
9.	Kuusamo	Kemilän seudun metsästäjät ry	Toimitilojen kunnostus	5 000,00

10.	Taivalkoski	Taivalkosken Kuohu ry	Yhdistysten investoinnit - koordinoitihankkeen alahanke	3 100,00
11.	Taivalkoski	Polojärven jakokunta	Muikun mukaan 2	1 310,83
12.	Taivalkoski	Jokijärven kyläseura ry	Valoa Pölkky-teatterin yössä -hanke	4 988,00
13.	Kuusamo	Kuusamon Määttälänvaaran maamiesseura	Määttälänvaaran yhteiset harrastuspaikat	1 700,00
14.	Taivalkoski	Henkilökuntakerho Pihkapeukalot ry	Kivilammen kämpän kunnostus	1 300,00
15.	Kuusamo	Kuusamon Lintukerho ry	Nuoret mukaan lintuharrastukseen	2 250,00
16.	Posio	Jaksamon Jahti ry	Jaksamon Jahdin kodan rakentaminen	4 661,00
17.	Kuusamo	Salmisen maamiesseura	Isolahden ranta-alueen parantaminen	3 148,76
Kaikki hakemukset yhteensä				54 538,59

KOORDINOINNIN KUSTANNUSARVIO JA TOTEUTUMA

HYVÄKSYTYT KUSTANNUKSET	
Palkkakulut ja palkkiot	15 360,00
Ostopalvelut	3 100,00
Kotimaan matkakulut	2 000,00
Muut kustannukset	3 400,00
Kokonaiskustannukset	23 860,00
HYVÄKSYTYT KUSTANNUKSET	23 860,00

H. raportointi ja seuranta

- hankkeesta on raportoitu Myötäle ry:n hallituksen kokouksissa säännöllisin väliajoin, joka on toiminut hankkeen ohjausryhmänä
- alahankkeiden pienetkin muutokset on käsitelty ohjausryhmässä
- Myötäle ry:n toiminta-alueen eri tilaisuuksissa on tiedotettu hankkeen etenemisestä (valinnasta ym.)
- annettu lehdistötiedotteita
- alahankkeita on pyydetty ilmoittamaan lehtijuttujen yhteydessä, että rahoitusta on saatu Leader-ryhmä Myötäle ry:stä
- hankevastaava on ollut tiiviissä yhteistyössä alusta saakka alahanketoimijan mukana, perushakemuksesta maksatushakemukseen saakka

I. toteutusoletukset ja riskit

- alahankkeet ovat toteuttaneet hankettaan suunnitelmansa mukaisesti ja ovat osanneet reagoida, mikäli muutoksia on syntynyt, ottamalla yhteyttä
- toteutusoletuksena on pidetty sitä, että alahankkeiden hakijat ovat sitoutuneita toimenpiteiden toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti
- toteutusoletukset ovat erittäin hyviä ja rohkaisevia
- riskit ovat lähes olemattomat, koska alahankkeille maksatus ohjautui P-P ELY-keskuksen maksupäätöksen mukaisesti EU- ja valtion osalta ja Myötäle ry maksoi kunkin kuntarahaosuuden alahanketoimijoille

4.3. YHTEISTYÖKUMPPANIT

- Myötäle ry:n alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja yhteisöt
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- vuoden 2013 aikana olemme antaneet neuvoja ja ohjeistusta koordinoitihanke – mallin toteuttamiseen mm. Elävä Kainuu Leaderille
- Posion ja Taivalkosken kunnat sekä Kuusamon kaupunki
- Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kyläpäivien yhteydessä olemme jakaneet esitettä Myötäle ry:n alueella toteutettavista koordinoitihankkeista

4.4. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

- alahankkeeksi haki 17 alahanketta
- hanketta haki 17 eri rekisteröitynyttä yhdistystä
- koordinoitihankkeen avulla saimme runsaasti näkyvyyttä mm. lehtijuttujen avulla
- alueellemme koordinoitihankkeen merkitys on erittäin suuri, koska pienet toimijat pääsivät mukaan toimintaan ja konkreettisesti hakemaan rahoitusta Myötäle ry:ltä
- Myötäle ry on ainoa toimintaryhmä Pohjois-Pohjanmaan alueella joka toteuttaa koordinoitihanke mallia

4.4.1 KOORDINOINTI –HANKKEEN KYSELY JA YHTEENVETO

Myötäle ry on toteuttanut kolme eri koordinointi -hanketta vuosien 2011 -2014 aikana, joiden avulla on tuettu pieniä investointeja Koillismaan alueella toimiville yhdistyksille ja seuroille.

Vuoden 2013 joulukuussa teimme kyselyn kaikille niille koordinoitihankkeen alahanke toimijoille, jotka olivat päässeet mukaan toteuttamaan hankettaan.

Kyselyyn vastasi 19 hanketoimijaa. Vastausten perusteelle tärkeintä on ollut

neuvonta ja ohjaus, jotta hankehakemukset liitteineen on saatu täydellisenä

Myötäleelle. Hankkeiden avulla on saatu toteutetuksi asioita, jotka olisivat jääneet

tekemättä ilman tukea. Palautekyselyn yhteen veto on tämän loppuraportin

liitteenä.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEEKSI

Myötäleen hallitus kokee koordinoitihanke mallin soveltuvan erittäin hyvin Koillismaan toimijoille. Hyvät kokemukset osoittavat, että tämän tyyppistä toimintaa jatketaan seuraavallakin ohjelmakaudella esim. teemahakuina tai teemahankkeina.

6. HANKKEEN RAHOITUKSEN JA KUSTANNUSARVION TOTEUTUMINEN

Hankkeen hallinnoinnin eli koordinoinnin kustannusarvio ei toteutunut suunnitellulla tavalla, koska hankevastaavan työaika jakautui usealle muulle hankkeelle. Lisäksi ostopalveluiden kustannuksia olivat jakamassa muut Myötäle ry:n hallinnoimat hankkeet. Alahankkeiden tarvitseman yksityiskohtaisen ohjauksen ja neuvonnan määrä arvioitiin toteutunutta suuremmaksi. Ennakkoon oletettiin, että hankkeina toteutettaisiin pääsääntöisesti rakennusinvestointeja. Matkakuluja ei syntynyt siinä määrin, kun edellisessä hankkeessa. Syynä tähän oli, että hanketoteuttajat saivat sähköpostitse tai puhelimitse avun heitä askarruttaviin kysymyksiin eikä hankevastaavan tarvinnut mennä paikanpäälle. Hankkeesta on haettu loppumaksua maaliskuun 2014 aikana, mutta tähän hankkeeseen syntyneitä lomarahoja haetaan vasta heinäkuulla 2014. Lomarahat maksetaan kesäkuun palkan yhteydessä.

Hankkeen alahankkeet toteuttivat hankettaan hankesuunnitelman mukaisesti kustannustehokkaasti. Julkista tukea jäi käyttämättä 3317,68€. Alahankkeet olivat tiiviisti yhteydessä hankkeensa toteutusvaiheessa.



	EU	VALTIO	KUNTA	JULKINEN YHT.	YKS.RAHA	YKS.TALKOO	YHTEENSÄ
HYVÄKSYTTY	18 406,77	14 316,38	8 180,79	40 903,94	9 576,68	4 057,97	54 538,59
1. MAKSUERÄ	2 261,25	1 758,75	1 005,00	5 025,00	1 487,00	188,00	6 700,00
2. MAKSUERÄ	5 159,71	4 013,11	2 293,21	11 466,03	2 087,76	1 734,25	15 288,04
3. MAKSUERÄ	6 108,75	4 751,25	2 715,00	13 575,00	3 750,00	775,00	18 100,00
4. MAKSUERÄ	3 384,10	2 632,09	1 504,04	7 520,23	1 841,11	665,63	10 026,97
TOTEUTUNEET	16 913,81	13 155,20	7 517,25	37 586,26	9 165,87	3 362,88	50 115,01
KÄYTTÄMÄTTÄ	1 492,96	1 161,18	663,54	3 317,68	410,81	695,09	4 423,58


KOORDINOINTIOSION TOTEUTUMINEN

HYVÄKSYTYT KUSTANNUKSET		1.1.-30.8.2013	1.9.- 31.12.2013	1.1. – 30.6.2014 loppumaksu	KUSTANNUSTEN TOTEUTUMINEN
Palkkakulut ja palkkiot	15 360,00	7 336,17	3 615,75	6 334,92	17 286,84
Ostopalvelut	3 100,00	1 532,66	257,94	839,07	2 629,67
Kotimaan matkakulut	2 000,00	458,63	278,09	136,31	873,03
Muut kustannukset	3 400,00	953,83	363,28	1 414,64	2 731,75
Kokonaiskustannukset	23 860,00	10 281,29	4 515,06	8 724,94	23 521,29

VALOKUVAT



Jaksamon Jahdin kotarakennus

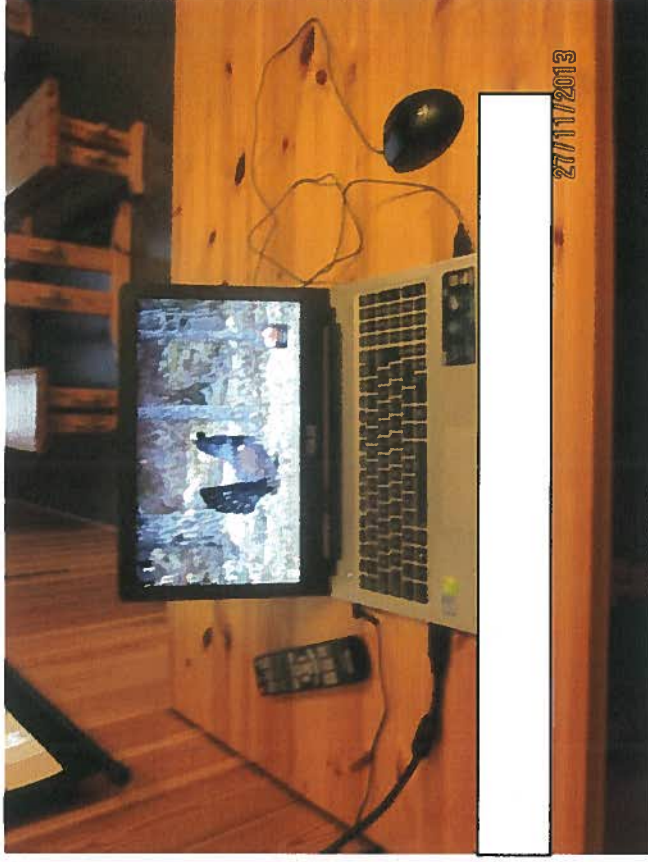


Purnun seudun metsästysseuran AV-laitehankinnat



VUOTUNGIN MAAMIESEURA RY, VUOTUNGIN KYLÄTALON KARAOKELAITEET



PIHKAPEUKALOT, KIVILAMMEN KÄMPÄN KUNNOSTUS

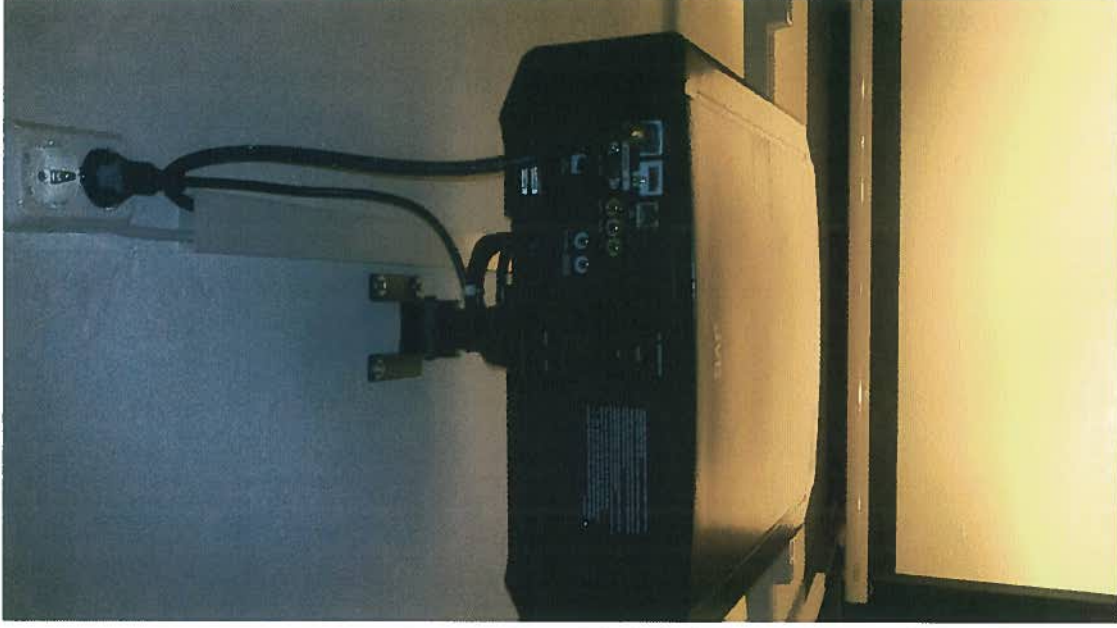

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖYHDISTYS "TEATTERIA JA ELOKUVIA



TAIVALKOSKEN KUOHU RY, KORIPALLON HARRASTUS MINITYTÖILLE

